
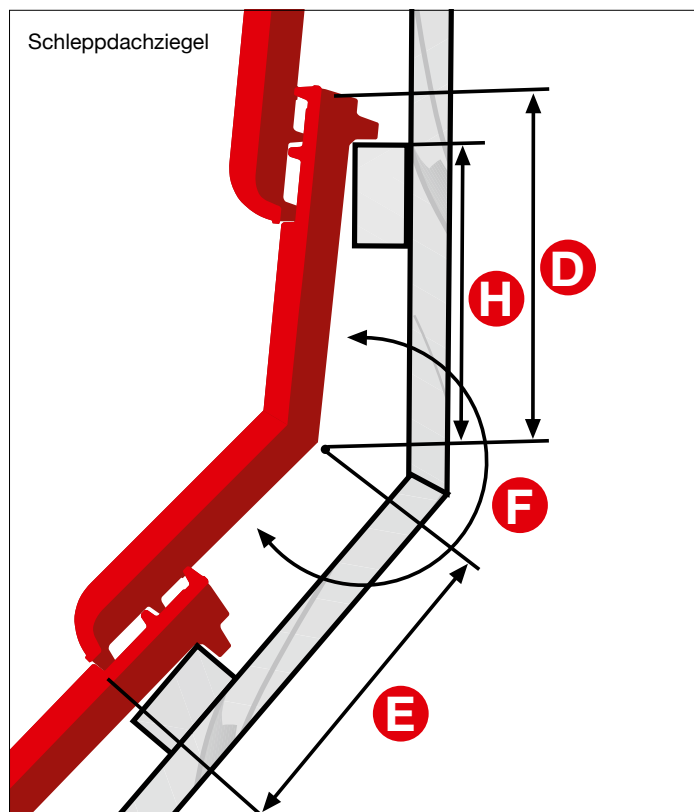


MAXIMAL PRODUZIERBARE GESAMTLÄNGE FÜR ALLE MODELLE (AUSSER G 10 PRO) = 500 M.

Lieferanschrift für Vorab-Muster:

Bauvorhaben:

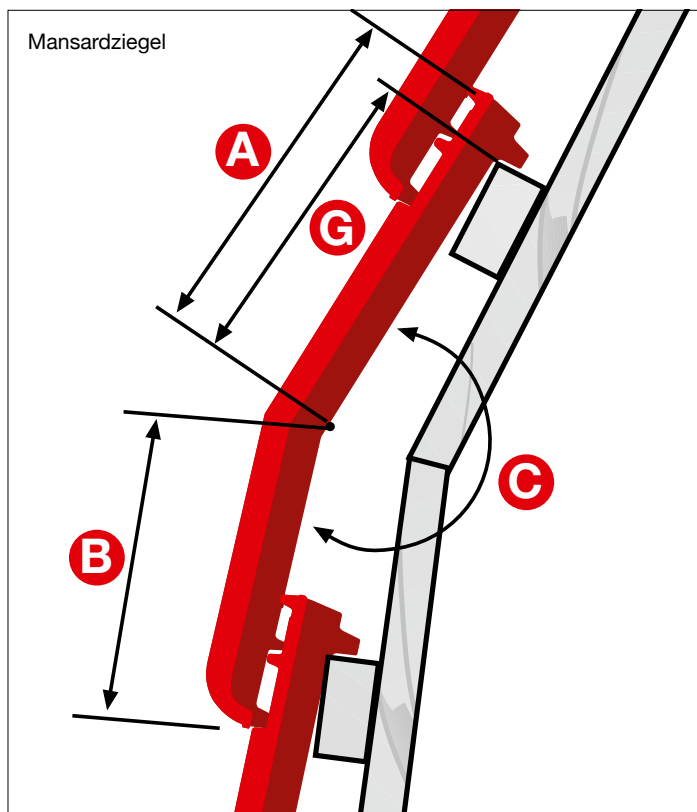

**MASSANGABEN VOM KUNDEN:**

Modell:

A =	mm
B =	mm
G =	mm
C =	° <

**MASSANGABEN VOM KUNDEN:**

Modell:

D =	mm
E =	mm
H =	mm
F =	° <

Mansard- und Schleppdachziegel werden individuell nach Ihren Maßangaben aus zwei Flächen-Ziegeln gefertigt. Angaben zur Dachneigung, Lattung und Schenkellängen sind die Basis der Produktion. Die Ziegel werden entsprechend der Dachneigung zugeschnitten, anschließend mit 2-Komponenten Epoxydharzkleber verbunden und in der gewünschten Farbe produziert. Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin. **Hinweis:** Werkseitig ist kein Bohrloch vorhanden.

Freigabe Vorab-Muster erteilt:

Korrekturen:



**RICHTIG MASSNEHMEN:**

Die meisten notwendigen Maßangaben entsprechen Ihrer Erfahrung aus dem Arbeitsalltag. Besonders hinweisen möchten wir auf folgende Maßangaben: (A): gemessen wird von der Oberseite des Ziegels bis in die Wasserverfaltung im Knick. Maß (H) und (G) werden gemessen von der Oberseite der Lattung bis in die Seitenverfaltung im Knick. Maß (B) wird gemessen vom Wasserfals bis zur Ziegel-Unterkante.
