


Lieferanschrift für Vorab-Muster:

Bauvorhaben:

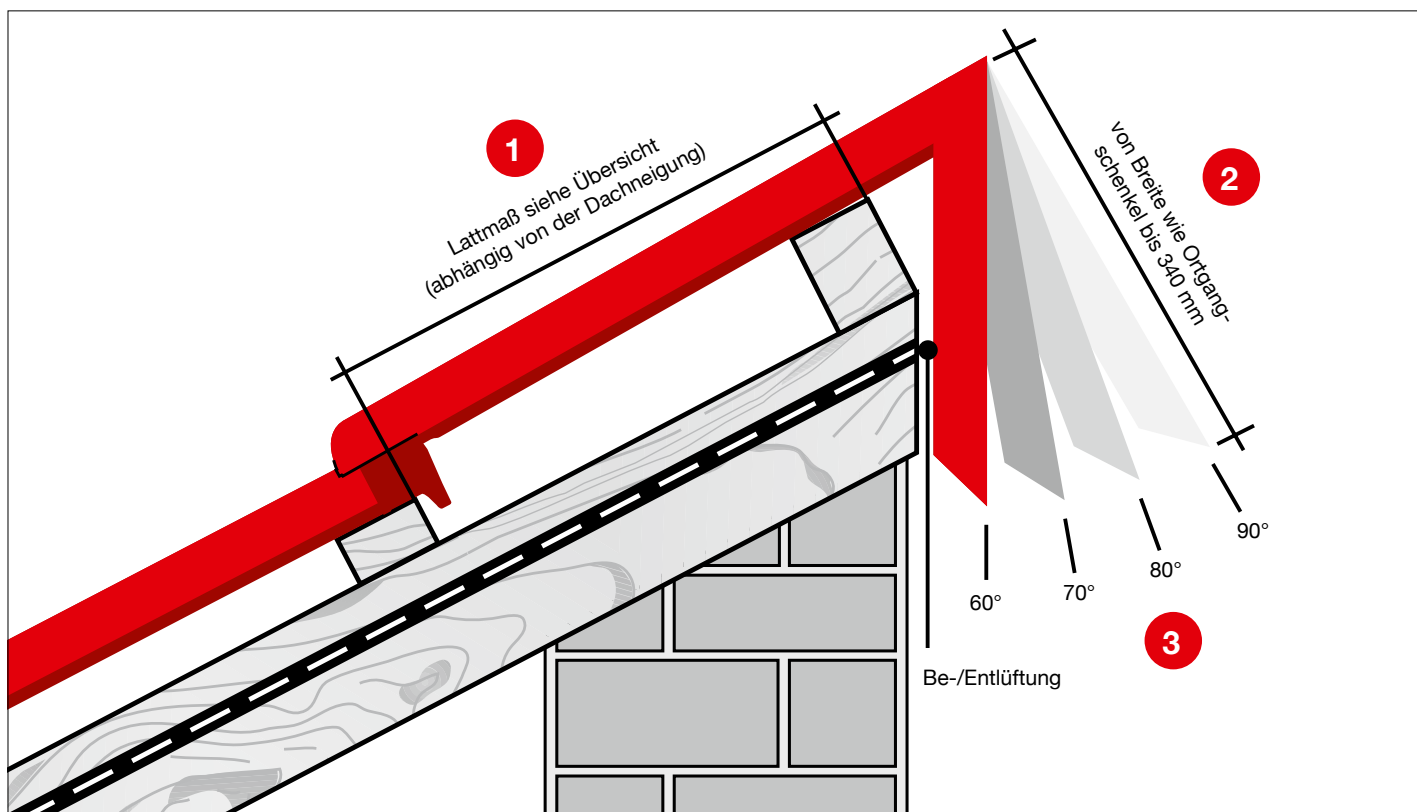

**ÜBERSICHT LATTMASS:**

90°	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ maximales Lattmaß von 335 mm</li> <li>▲ minimales Lattmaß von 120 mm</li> </ul>
80° = DN 10°	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ maximales Lattmaß von 315 mm</li> <li>▲ minimales Lattmaß von 120 mm</li> </ul>
70° = DN 20°	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ maximales Lattmaß von 295 mm</li> <li>▲ minimales Lattmaß von 120 mm</li> </ul>
60° = DN 30°	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ maximales Lattmaß von 270 mm</li> <li>▲ minimales Lattmaß von 120 mm</li> </ul>

**MASSANGABEN VOM KUNDEN:**

1. Lattmaß =	mm
2. =	mm
3. =	° ↙

**Hinweis:** von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich. Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werkseitig.

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben). Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt:

Korrekturen:
